

Funksjons- og oppgavefordeling: Tidslinje

Styresak 29/2025
Vedlegg 3

Prehospital Opptopping

- Bemanning døgnbil Mosjøen
- Bemanning dagbil Mosjøen
- Utstyr 2 ambulanser
- Midlertidige stasjonsfasiliteter
- Trygg akuttmedisin, gjennomfør utrullingsplan – i drift fra 1. mai

Omstilling personell


- Utvalgskrets og bemanning
- Informasjonsmøter og kartleggingssamtaler
- Innplassering
- Drøfting §15.1

Klargjøring overføring

- Plan for flytteprosess
- Overføringsplan for pasienter
- Inhospital beredskap på plass, grunnbemanning i nødvendig grad i akuttstuskehusene. Nødvendige kompetansehevede tiltak iverksettes
- Utrede behov for akuttbil i ambulansesone 3

Funksjons- og oppgavefordeling

- Utrede døgnpost godkjent for innleggelse etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern §§ 3-2 og 3-3
- Styrkning FMR SSJ, utrede rehabiliteringspost MSJ og Observasjonspost DMS
- Styrkning pediatri – dialog med helse nord om oppdrag

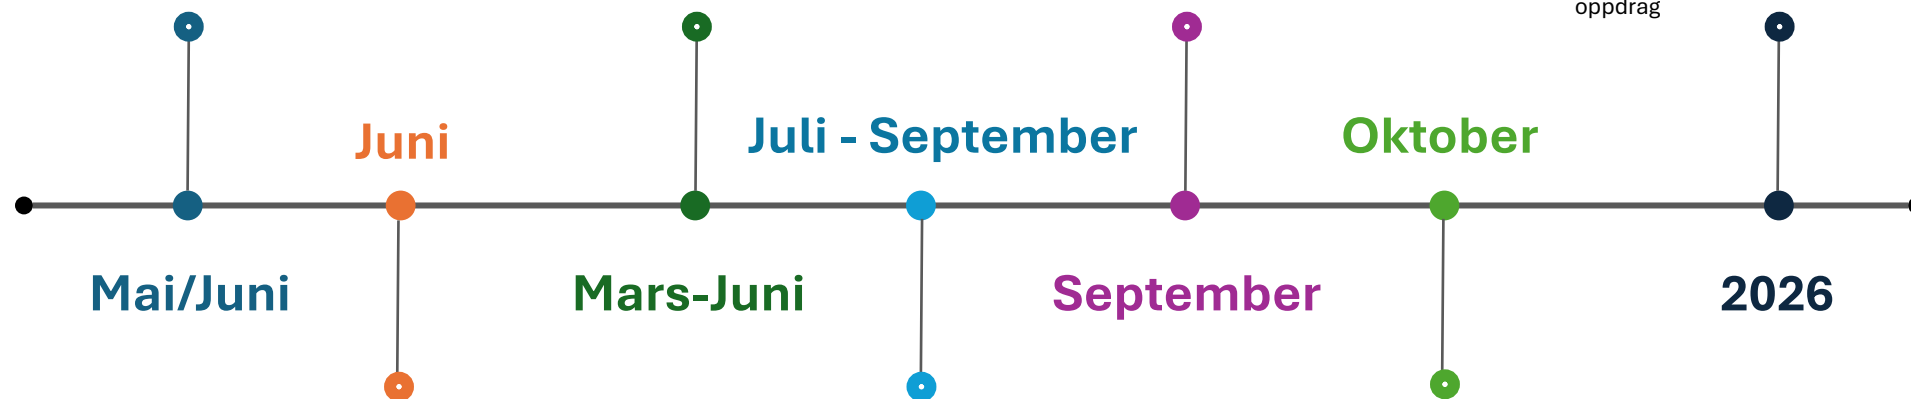

Forberede overføring

- Forberede overføring av akutt og døgnfunksjoner i en første fase
- ROS HMS
- ROS akuttmedisinsk beredskap - OU prehospital
- Utrede obs/intermediær i samarbeid med Vefsn

Arealmessig tilpassing

- Nødvendig styrking av inospital beredskap
- Utvide Intensiv MIR
- Klargjøring flere rom i akuttmottak MIR
- Klargjøre flere rom i med.sengepost MIR
- Klargjøre flere rom i med.sengepost SSJ
- Klargjøre flere rom i kir.sengepost SSJ

Akutt- og døgnvirksomhet overført

- Akutt- og døgnfunksjoner overført til akuttstuskehusene
- Plan for døgnoperasjoner urologi. Herunder: nødvendig innkjøpt MTU. Nødvendig opplæring av operasjonsteam, logistikk og disponering av operasjonsstuer
- Slagalarm Mosjøen
- Beredskap – prosedyrer, justeringer og implementering

Tidslinje Gjennomføringsplan	Mars		April		Mai		Juni		Juli		Aug,		Sept		Okt		Nov		Des		Jan		2026		Merknad
Overordnet organisasjon																									
Helse Nord	14.mar	24.mar																						Vedtak 14.03, foretaksprotokoll 24.03, GO-nogo-møte	
Styremøter i Helgelandssykehuset			07.apr	29.apr		26.mai		18.jun			25.aug		24.sep		29.okt		24.nov		17.des					7.4 tidslinje,29.4 innspill Helse Nord økonomisk langtidsplan,26.5 leveranse Helse Nord, 24.9 leveranse Helse Nord	
Digitale allmøter månedlig																								Gå fra frekvens annen hver mnd til månedlig. Ukentlig plan på intranett omstillingssider.	
Ledelse, organisering, styring, budsjett og rapportering			11.apr										go-no-go											Rigg arbeid, ressurser og styring, Go-nogo	
Partssamarbeid og vernetjeneste																								FTV, vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg - tilpasse møteplan og frekvens.	
Dialog Helse Nord investeringsmidler og omstilling			07.apr		01.mai																			AD har dialog ihht HSYK styrevedtak 24.01, innspill til ØLP i april.	
Omstillingsplan Helgelandssykehuset			04.apr					22.jun						01.okt										Tidslinje - vedtatt og ligger til grunn 4.4 Drøftinger ferdig, 22.6 bekreftelse kontrakter, 1.10 ny struktur	
Organisering KGO trinn Hele HSYK er organisert med faglig ledelse på nivå 2 og 3							01.jun												31.des					1.6 Ass klinikkshjef med medisinskfaglig kompetanse i med og kir klinikk, 31.12 KGO trinn 2 faglig ledelse nivå 3 iverksettes.	

Vefsn kommune dialog utvikling av samhandlingstilbud	01.mar	21.mar	01.apr											01.okt										Søknad om midler 2025 oversendt, videre samarbeid til tildeling 2026 med frist tentativt 1.10.25, fast møteplan etableres etter avtale.
Beslutte møteplan med kommuner på Helgeland (politisk ledelse, adm.ledelse og fastleger/kommuneoverleger)			11.apr																					Vurderes i samarbeid med sekretariatet i Helsefellesskap Helgeland. Foretaksprotokoll pkt. 12 tas opp i partnerskapsmøte Helsefellesskap Helgeland 24. april.
Ekstern kommunikasjon samfunnskontakt																								
Projekter/utredninger																								
ROS HMS			11.apr			01.jun																		11.4 Ferdig enheter, behandling AMU uke 19-21
ROS Vaktlinjer, se videre beredskap			11.apr	25.apr																				11.4 Rapport, 25.4 Behandlet. Overvåke fortløpende.
Intensiv beredskap			15.apr																					Intensivkapasitet HSYK
Obs/intermediær-post MSJ - utrede								20.jun																Foretaksprotokoll 24.03. Ferdig utredning innen 20.06.2025. I samarbeid med Vefsn kommune, Grane og Hattfjelldal. Avtalt igangsatt 24. mars. Vurdere juridisk fortrinn til evt. stillinger.

Observasjonspost Brønnøysund utredning										01.aug												01.jul	Rekruttering- og samhandlingsmidler (RS); søknad om midler til forprosjekter behandlet i Helsefellesskapet, sendt Helse Nord 1.4. Tildelingsutvalg medio april. Evt. oppstart 1.5. Søknad finansiering RS tildeling 2026 evt.
Rehabilitering Mosjøen utredning													01.okt									01.jul	Rekruttering- og samhandlingsmidler (RS); søknad om midler til forprosjekter behandlet i Helsefellesskapet, sendt Helse Nord 1.4. Tildelingsutvalg medio april. Evt. oppstart 1.10. Søknad finansiering RS tildeling 2026 evt.
ROS urologi personell med tiltak					01.mai				01.jul														Tilstedeværelse/ ambulerende av urolog i SSJ, rekruttering. 1.5 ROS ferdigstilt 1.7 Beslutning tiltak.
ROS akuttmedisinsk beredskap							01.jun																ROS-analyse ferdig innen 1. juni ref. foretaksprotokoll 24.03. Prosjekteier klinikksjef prehospital/med.dir, i samarbeid med kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal
Prosjekt slagalarm MSJ												01.sep											Prosjekteier klinikksjef prehospital, i samarbeid med kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal

[illegible]

LIS 1 fra H25 SSJ og MIR							01.jun							01.okt										Fordeling LIS1 ved utlysning, konsekvenser MSJ før overføring av akutt og døgnvirksomhet
Samarbeid utdanningsinstitusjoner om studenter i praksis							01.jun																	
Personell																								
Bemanningsplaner og vaktplaner														01.okt										Nye bemanningsplaner i tråd med krav og løsningsforslag.
Ansette 8 amb.personell døgnbil MSJ							01.jun																	Oversikt over kvalifikasjonskrav er utarbeidet og drøftet. Stillinger lyst ut i begynnelsen av april. Ansettelse i starten av mai
Ansette 4 amb.personell dagbil MSJ							01.jun																	Oversikt over kvalifikasjonskrav er utarbeidet og drøftet. Stillinger lyst ut i april. Ansettelse i starten av mai
Utstyr til 2 ambulanser				01.apr																				Utført, vil være på plass innen 1. april
Tilsetting (oppstart) personell i SSJ og MIR								23.jun																Rekrutteringsprosess må starte opp før 23.6 og skjer fortløpende ved oppsigelser, HR lager oversikter
Tjenestenivå drift og eiendom i MSJ etter 1.10								30.jun																Tilpasses drift i Mosjøen
4 stillinger psyk.poliklinikk (B 2026)																	15.des							Budsjett 2026.
Bygg og utstyr																								
Midlertidige stasjonsfasiliteter MSJ							01.jun																	Planlegging pågår
Prosjektere ny ambulansestasjon MSJ																						31.des		Prosjektering 2025.
Innkjøp CT														01.okt										Innkjøpsprosess, anskaffelse, må finansieres

Utvide intensivavd (kapasitet MIR/SSJ ny vurdering)												01.sep											Sees i sammenheng med intensivkapasitet HSYK
Klargjøre flere rom i akuttmottak MIR												01.sep											Utført av DE
Klargjøre flere rom i med sengepost MIR												01.sep											Jf. løsningsforslag
Klargjøre flere rom i med sengepost SSJ												01.sep											Jf. løsningsforslag
Klargjøre rom i kir sengepost SSJ												01.sep											Jf. løsningsforslag
Urologi op.utstyr besluttet til anskaffelse					01.mai																		Kvalitetssikring av foreliggende liste
Oppussing op.avd. MSJ																		31.des				31.des	Inkl. takpendler (status anbefalt), ikke finansiert
Arealplanlegging og oppussing SSJ																		31.des				31.des	Arealplanlegging, innbydende lokaler (trivsel og velvære), barnevennlig (status anbefalt) ikke finansiert
Driftsplanlegging																							
Forberede overføring av akutt og døgnfunksjoner i en første fase frem til 1.6.2025							01.jun																Jamfør foretaksprotokoll vedtakspunkt 2.
Planlegging op. aktiviteten SSJ												01.sep											Logistikk av op. Stueaktivitet. Disponering av operasjonsstuer
Planlegging av flytteprosess									01.jul														Ihht foretaksprotokoll, lages innen 22.06, trinnvis eller dato vurderes.
Overføringsplan av pasienter												01.sep		01.okt									Ihht foretaksprotokoll, utføres innen 22.06
Konsekvenser psykisk helse og rus MSJ ved overføring akutt- og døgnvirksomhet fra Mosjøen												01.sep											Forberedes før 1. juni. Iverksett kompenserende tiltak før 1. oktober
